

內政部營建署

111年度第一次營造業工地主任
評定考試試題



內政部營建署
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior

第一類科 (A)

一般式選擇題

題號	題目	選項
1	有關距離測量，下列敘述何者有誤？	<p>A. 精密雷射測距儀，中長距離測量精度可達 mm 以下。</p> <p>B. 雙頻雷射測距儀，測量精度可達 0.01 nm 以下。</p> <p>C. 採用都卜勒效應的雙頻雷射干涉儀，能在數十 m 範圍內達到 0.01 μm 的計量精度。</p> <p>D. 採用 CCD 線列感測器測量微距離可達到幾個 0.01 μm 的精度。</p>
2	梯間垂直放樣作業方法，下列何者不包括在內？	<p>A. 水準儀照準。</p> <p>B. 垂球垂準。</p> <p>C. 雷射垂準器。</p> <p>D. 經緯儀照準。</p>
3	有關線路工程，下列敘述何者不恰當？	<p>A. 線路工程是指長寬比很大的工程。</p> <p>B. 包括公路、鐵路、運河、水明渠、輸電線路、各種用途的管道工程等。</p> <p>C. 主要有勘測設計階段的測量與施工放樣的測量。</p> <p>D. 這些工程的主體一般是在地表，也有在地下的，但不包括在空中的。</p>
4	重型施工架與輕型工作架，係依據施工架下列使用分類？	<p>A. 使用目的。</p> <p>B. 使用型式。</p> <p>C. 所用材料。</p> <p>D. 使用運輸。</p>
5	依據起重機升降機具安全規則規定，對於營建用提升機，遭受瞬間風速達每秒多少公尺以上應停止作業？	<p>A. 10 公尺。</p> <p>B. 20 公尺。</p> <p>C. 25 公尺。</p> <p>D. 30 公尺。</p>
6	先以鑽掘機之螺旋鑽桿依規定之位置、樁徑及深度鑽掘樁孔，並將水泥砂漿注入樁孔內，為下列何種擋土設施？	<p>A. 連續壁擋土設施。</p> <p>B. 鋼板樁擋土樁設施。</p> <p>C. 預壘樁擋土樁設施。</p> <p>D. 鋼軌樁襯板擋土樁設施。</p>
7	依據營造安全衛生設施標準規定，施工架工作臺應低於施工架立柱頂點多少公分以上？	<p>A. 100 公分。</p> <p>B. 105 公分。</p> <p>C. 110 公分。</p> <p>D. 115 公分。</p>


8	以下何者不是一份好的施工計畫書應具有的功能？	<p>A. 確認工程執行流程。</p> <p>B. 施工計畫規劃與現場執行不求達到寫、做合一。</p> <p>C. 預測工程執行過程中預期現金流量。</p> <p>D. 儘早發現工程執行將會遭遇之困難點。</p>
9	驗收時，接管或使用機關（單位）人員擔任之分工應為：	<p>A. 主驗人員。</p> <p>B. 協驗人員。</p> <p>C. 監驗人員。</p> <p>D. 會驗人員。</p>
10	估計作業所需之工期時，以下何者不是考慮的項目？	<p>A. 工程數量。</p> <p>B. 施工方法。</p> <p>C. 抽查品質。</p> <p>D. 施工效率。</p>
11	A 與 B 作業共為 C 作業之前置作業，A 與 C 作業之關係為 FS-1，B 與 C 作業之關係為 SS+2；A 作業的 EF 與 B 作業的 ES 皆為第 10 天，則以下敘述何者錯誤？	<p>A. 作業 C 在作業 A 完成前 1 天就可開始施作。</p> <p>B. 作業 C 要等作業 B 開始 2 天後才可以開始施作</p> <p>C. 作業 C 最早可以在第 9 天開始施作。</p> <p>D. 作業 C 的 ES 為第 12 天。</p>
12	以管制「即時要徑」作為工期管理的手段，此稱為：	<p>A. 要徑法。</p> <p>B. ADM 網狀圖。</p> <p>C. 計畫評核術。</p> <p>D. PDM 網狀圖。</p>
13	為了建立成本管理系統，在事前準備作業中須探討的三大重點中，不包括以下何者？	<p>A. 成本科目之設定。</p> <p>B. 精確的數量計算。</p> <p>C. 品質稽核。</p> <p>D. 單價分析與市場調查。</p>
14	供應商的管理考核評鑑中，下列何者不是考核主要項目？	<p>A. 工安。</p> <p>B. 交貨。</p> <p>C. 財務能力。</p> <p>D. 服務。</p>
15	不合格物料與器材之管制方法如下：1. 錯用物料或器材之重新施工規定。2. 修補規定。3. 瑕疵物料或器材之重新分等作選擇性之使用。4. 不合格物料或器材之拒收或報廢。以上哪兩項應報請業主同意執行？	<p>A. 第 1 項、第 2 項。</p> <p>B. 第 3 項、第 4 項。</p> <p>C. 第 1 項、第 4 項。</p> <p>D. 第 2 項、第 3 項。</p>

16	以下何者不是工程人員本身及其與外部之互動關係的義務發生對象？	<p>A. 業主 / 客戶。</p> <p>B. 承包商。</p> <p>C. 僱主 / 組織。</p> <p>D. 親人或家屬。</p>
17	各樓層管道間界面之整合，以下何者為不正確？	<p>A. 垂直管道間之管線如樓層穿越防火區劃區，管線穿越處應予以防火填塞。</p> <p>B. 垂直管道間內電氣、弱電管線，應與給排水消防等管路合併施設於同一管道間。</p> <p>C. 管道間配管施工時，管路最上緣管口應封端以免雜物掉入。</p> <p>D. 浴室管道間應配合配管砌磚到頂板。</p>
18	工程倫理課題之抉擇與思考條件流程，以下順序何者不正確？	<p>A. 收集事實資料在辨識利害關係人之前。</p> <p>B. 辨識利害關係人在辨識因果關係之前。</p> <p>C. 辨識自身的義務責任在辨識所有方案之前。</p> <p>D. 辨識自身的義務責任在辨識因果關係之前。</p>
19	營造工程施工管理之主要項目不包括以下哪項？	<p>A. 施工方法。</p> <p>B. 人力。</p> <p>C. 施工機具與設備。</p> <p>D. 智能。</p>
20	全套管基樁取土設備中的螺旋鑽，較不適用於何種土層？	<p>A. 黏土層。</p> <p>B. 卵礫石。</p> <p>C. 軟岩層。</p> <p>D. 有地下水時。</p>
21	下列哪一項不是「巨積混凝土」控制混凝土的發熱量與構件內側溫度的方法？	<p>A. 採用冰屑或低溫水。</p> <p>B. 減少水泥用量。</p> <p>C. 增加飛灰。</p> <p>D. 利用大型風扇降溫。</p>
22	瀝青混凝土路面鋪築時，壓路機應為自動式之鐵輪壓路機及膠輪壓路機或振動壓路機，其中每層厚度多少公分以上之瀝青混凝土路面，才可使用振動壓路機滾壓？	<p>A. 3 公分。</p> <p>B. 5 公分。</p> <p>C. 10 公分。</p> <p>D. 15 公分。</p>

23	下列何者不是節塊推進施工設備中『鼻樑』的功能？	<p>A. 導引首段節塊之推進方向。</p> <p>B. 平衡推進過程節塊、樑體之施工荷重。</p> <p>C. 平衡首段節塊彎曲力距。</p> <p>D. 承受吸收撞擊力量，避免破壞橋面版主結構。</p>
24	於噴嘴前加水之噴凝土稱為？	<p>A. 濕式噴凝土。</p> <p>B. 乾式噴凝土。</p> <p>C. 自充填混凝土。</p> <p>D. 加水噴射混凝土。</p>
25	對於邊坡穩定實施監測，承包商須妥擬監測計畫書，於施工前多少日程送工程司核可備查？	<p>A. 2 週。</p> <p>B. 3 週。</p> <p>C. 4 週。</p> <p>D. 1 個月。</p>
26	採用鋼軌樁作為擋土支撐工法，開挖面與木嵌板間之空隙可填以何種材料並搗實？	<p>A. 皂土穩定液。</p> <p>B. 砂土。</p> <p>C. 黏土。</p> <p>D. 飛灰。</p>
27	土壤變形較小地盤，若建築物外柱有偏心載重，為了減輕外柱負擔，將外柱及內柱的基礎版聯成一體，建議採用以下何種淺基礎型式？	<p>A. 墩基礎。</p> <p>B. 聯合基礎。</p> <p>C. 連續基礎。</p> <p>D. 沈箱基礎。</p>
28	擋土措施分類中，下列何者屬於透水性壁體？	<p>A. 主樁橫版條。</p> <p>B. 溝槽版樁。</p> <p>C. 場鑄式連續壁。</p> <p>D. 預鑄排樁。</p>
29	鑽掘式基樁施工時，鑽孔若遭遇疏鬆砂土層，需使用以下何種方式穩定鑽孔壁面？	<p>A. 孔內填注皂土泥漿。</p> <p>B. 孔內填注常溫清水。</p> <p>C. 孔內填注高溫熱水。</p> <p>D. 孔內抽氣保持低壓。</p>
30	依據職業安全衛生署「重大災害通報及檢查處理要點」職業災害類型分類表共計有幾類職業災害類型？	<p>A. 8 類。</p> <p>B. 9 類。</p> <p>C. 10 類。</p> <p>D. 23 類。</p>


情境式選擇題

一傾斜地量距，測得結果：斜距 S 為 $20.00\text{ m} \pm 0.05\text{ m}$ ，仰角 a 為 $30^\circ \pm 10''$ ，請回答下列問題：



題號	題目	選項
31	水平距離 D 最接近下列何者？	A. 15.00 m。 B. 17.32 m。 C. 34.64 m。 D. 23.09 m。
32	水平距離之標準差最接近下列何者？	A. 0.005 m。 B. 0.010 m。 C. 0.020 m。 D. 0.040 m。

彭主任為台南美術館標案的工地主任，以下為其所擬的 PDM 網圖進度網圖。施工中若發生以下情事時，他該如何決策呢？請回答下列問題：

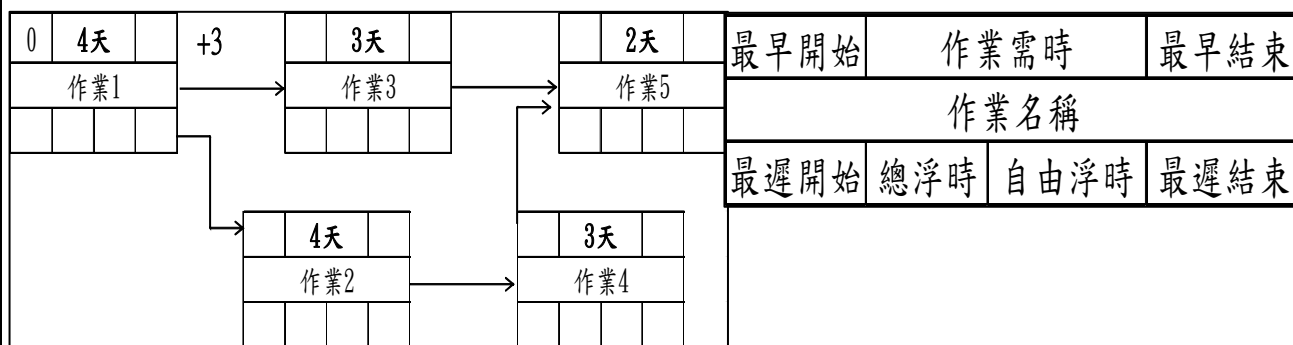

33	若發生契約文件之釋疑問題，則彭主任以下何者的判定為不正確？	A. 條款優於圖面。 B. 規範先於價目單。 C. 規範優於圖面。 D. 大比例圖面優於小比例圖面。
34	若作業 5 的實際進度對應預算為 2 仟萬元，以及實際進度發生成本為 4 仟萬元，則成本績效指數為：	A. 2 仟萬元。 B. 2。 C. 0.5。 D. -2 仟萬元。

35	作業 2 的總浮時為：	A. 0 天。 B. 1 天。 C. 2 天。 D. 4 天。
36	作業 1 的自由浮時為：	A. 0 天。 B. 1 天。 C. 2 天。 D. 4 天。
37	作業 5 的總浮時為：	A. -1 天。 B. 1 天。 C. 2 天。 D. 0 天。
38	作業 5 的自由浮時為：	A. -1 天。 B. 1 天。 C. 2 天。 D. 0 天。
營造廠計畫承接基礎工程，經基礎設計分析採用樁基礎作為構造物支承結構。請回答下列問題：		
39	公司期望採用目前普遍應用於基樁施工，在鑽掘及混凝土澆注時孔壁均有完整保護，施工品質較易確保的工法，你會建議下列何種工法？	A. 全套管鑽掘樁。 B. 反循環工法。 C. 鑽掘式基樁。 D. 衝擊式基樁。
40	地下開挖時遭遇卵礫石、軟岩等地層無法以機械打設，此時擋土設施應採用何種方式施作？	A. 人工擋土柱。 B. 鋼軌樁。 C. 鋼板樁。 D. PC 樁。
某工程公司進行一道路工程統包工程，完成規劃、設計、施工等不同階段的工作。請回答下列問題：		
41	為了在設計規劃中能夠確實控制土方量，選定路面高程所進行的測量作業應該是下列何者？	A. 地形測量。 B. 邊界線測設。 C. 樣板打設。 D. 中心點測設。
42	較適合於現場進行大範圍之土方挖填作業，並於行進中鏟土，滿載後快速移動至填土位置攤平填土的機具為下列何者？	A. 刮運斗 (機)。 B. 挖溝機。 C. 斗輪開挖機。 D. 出土抓斗 (機)。
43	土方裝載、運輸應考量其重量及其漲縮比，做為合理丈量計價依據。依據參考值，下列何種土方膨脹率最高？	A. 黏土 (乾)。 B. 黏土 (濕)。 C. 砂 (乾)。 D. 砂 (濕)。

某一橋梁工程即將跨過一條廣闊而且水深的河流，經過詳細的沿線地下地質調查結果顯示地下地層構造分布均勻，請回答下列問題：

44	本座橋梁的基礎採用何種形式比較合適？	A. 井式基礎。 B. 沉箱基礎。 C. 樁基礎。 D. 擴展式基礎。
45	本座橋梁的上部結構施工規劃採用場鑄工法，落墩數規劃最少時，較不適合採下列何種工法？	A. 就地支撐工法。 B. 支撐先進工法。 C. 平衡懸臂工法。 D. 節塊推進工法。
有一處開發建案採用鋼板樁作為臨時擋土支撐，請回答以下問題：		
46	土壤室內實驗若要進行不擾動土樣三軸試驗，建議鑽探時採用的取樣方式為何？	A. 螺旋鑽取樣。 B. 標準貫入試驗取樣器取樣。 C. 圓錐貫入試驗取樣器取樣。 D. 薄管取樣器取樣。
47	於鋼板樁拆除時，緊接於地下構造物底板以上之第一層支撐，在底板混凝土澆置後應留置原處至少多久？	A. 12 小時。 B. 24 小時。 C. 48 小時。 D. 72 小時。
48	接續上題，其餘各層支撐應留置原處，直到預計承受由拆除支撐所傳遞荷重之混凝土達到 28 天抗壓強度之多少 % 以上為止？	A. 50%。 B. 80%。 C. 90%。 D. 100%。
A 電力股份有限公司之南區電塔修繕工程由張小君承辦，經由公開招標方式將南區電塔修繕工程交付 B 工程公司承攬，B 工程公司負責人王大明指派林小朋為現場之工作場所負責人，並委由 C 公司負責設計及監造，現場指派孫小毛為監造人員，B 公司所僱勞工於修繕電塔時發生墜落死亡重大職業災害，A 電力股份有限公司有違反安全衛生相關規定，請回答下列問題：		
49	依職業安全衛生法規定，有關職業災害補償與賠償事項說明，下列何者為正確？	A. A 電力股份有限公司為原事業單位，僅負補償之連帶責任。 B. B 工程公司負責人王大明為雇主，已負刑事責任，無須再負補償與賠償責任。 C. A 電力股份有限公司為原事業單位，有違反職業安全衛生法規定時，負補償與賠償之連帶責任。 D. A 電力股份有限公司為業主身分，不用負補償與賠償之連帶責任。
50	本案重大職業災害下列何人需負職業安全衛生法刑事罰？	A. 王大明。 B. 孫小毛。 C. 張小君。 D. 林小朋。
